


**ANALISA MANAJEMEN RISIKO SAAT RENCANA DAN
PELAKSANAAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG
PENGADILAN NEGERI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1
Pada jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik
Universitas Andalas*

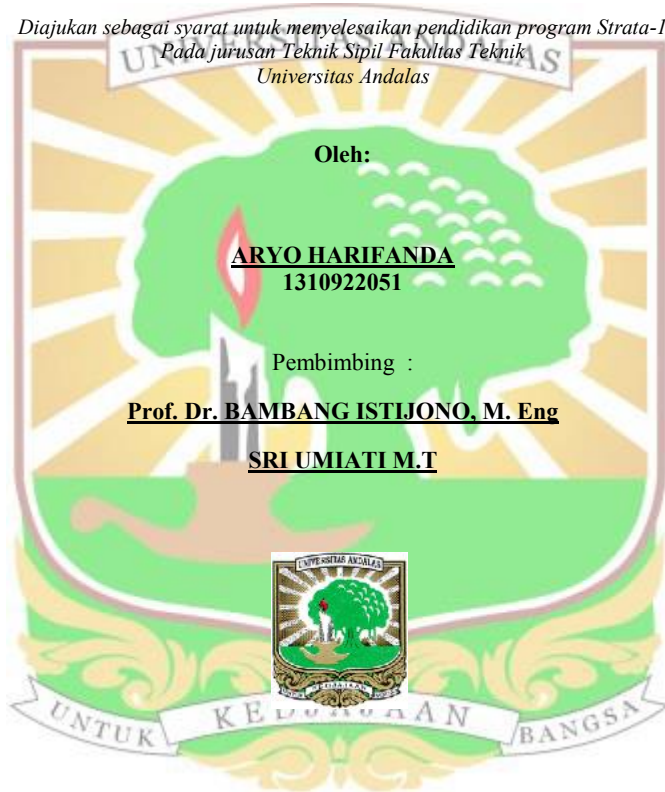

Oleh:

ARYO HARIFANDA
1310922051


Pembimbing :

Prof. Dr. BAMBANG ISTIJONO, M. Eng
SRI UMIATI M.T

**JURUSAN TEKNIK SIPIL-FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

**ANALISA MANAJEMEN RISIKO SAAT RENCANA DAN
PELAKSANAAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG
PENGADILAN NEGERI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

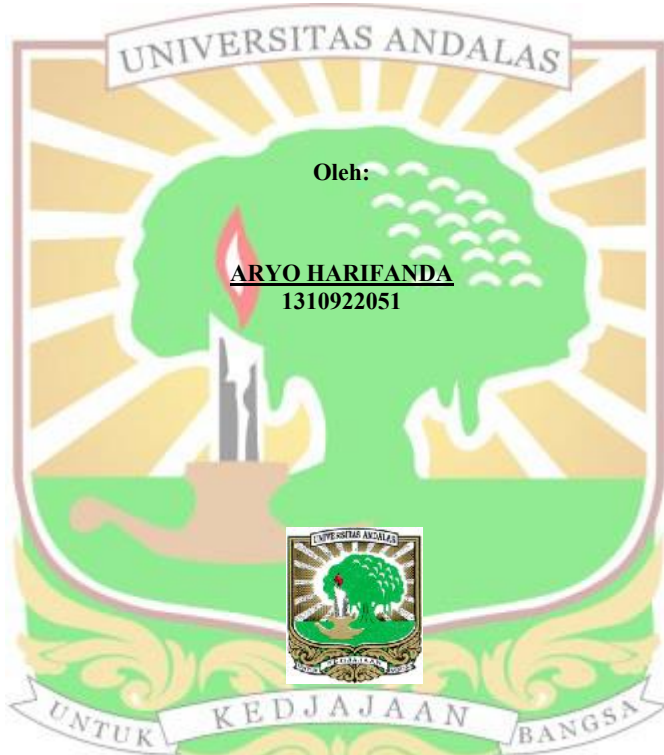

JURUSAN TEKNIK SIPIL-FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

Risiko merupakan akibat yang mungkin terjadi secara tak terduga. Kegiatan proyek yang telah direncanakan dengan seksama tetap mengandung ketidakpastian akan tercapainya target pekerjaan dan berjalan sesuai rencana. Maka untuk mengatasi ketidakpastian tersebut harus ada manajemen risiko, suatu proyek tidak dapat disamakan dengan manajemen risiko proyek lain karena banyaknya faktor - faktor risiko yang berbeda tiap proyeknya. Tujuan tugas akhir ini untuk mengidentifikasi pelaksanaan manajemen risiko oleh PT.Sumber Midya Karya di proyek Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kota Padang saat rencana sampai pelaksanaan proyek. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan cara menanyakan data manajemen risiko proyek, pengumpulan sumber- sumber penelitian terdahulu, melakukan survey ke lokasi proyek agar adanya persamaan persepsi isu risiko yang ditinjau dan yang terjadi di lokasi proyek. Penelitian ini juga dilakukan dengan wawancara dan pemberian kuisioner terhadap responden yaitu kontraktor PT. Sumber Midya Karya, dari hasil wawancara dan kuisioner maka didapatkan pihak pihak yang bertanggung jawab jika terjadinya risiko, analisa risiko ditiap pekerjaan juga penanganan risikonya, Apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, Hasil penelitian ada beberapa poin pada level risiko proyek pembangunan gedung pengadilan negeri kota padang yang pelaksanaan dan perencanaannya berbeda tetapi sebagian besar sudah sesuai, Dan bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko yang dilaksanakan sudah baik.

Kata kunci : *Manajemen risiko, identifikasi, proyek konstruksi gedung*
