

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN /
REHABILITASI/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI AIR
NGA'AI (DAK) KECAMATAN LEBONG TENGAH**


LAPORAN TEKNIK

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Profesi pada Program
Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas*

BAYU AGUNG PRASETYA, ST
NIM. 2441612041

PEMBIMBING:

Prof. Dr.Ir. James Hellyward, MS, IPU, ASEAN Eng, APEC Eng

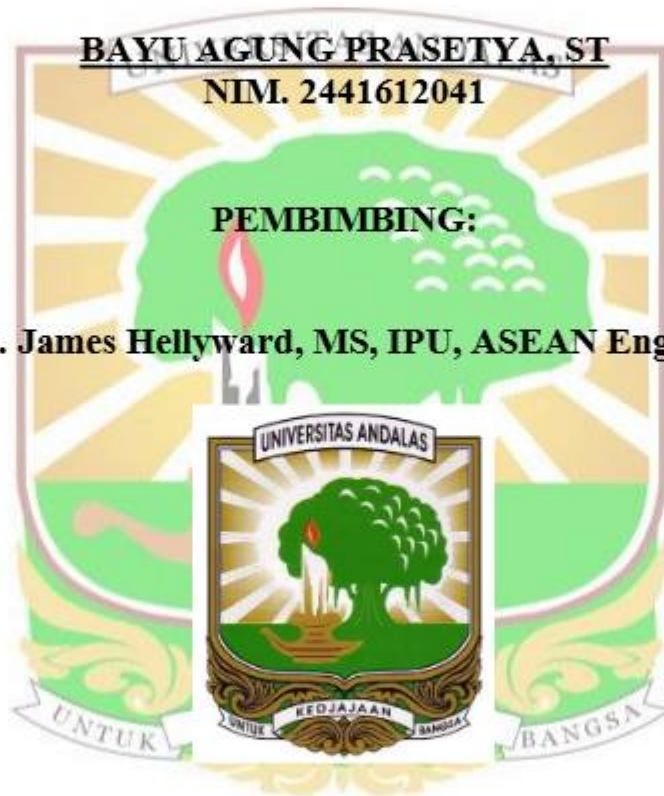

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

ABSTRAK

Pelaksanaan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air Nga' ai (DAK) Kecamatan Lebong Tengah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Putra Rejang Jaya sebagai Kontraktor Pelaksana dan CV. Palemo Konsultan sebagai Konsultan pengawas. Pekerjaan dilaksanakan dalam waktu 210 hari kalender dengan anggaran Rp. 3.199.971.700,- (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*). Dalam rangka menjamin pekerjaan berkualitas pihak kontraktor dan konsultan pengawas ditambah pengawas dari PU berkomitmen akan menjaga ketepatan mutu, biaya dan waktu. Pentingnya Manajemen pada tahapan pekerjaan untuk mencapai keuntungan perusahaan sehingga menjadi tumbuh dan berkembang secara maksimal dan dapat menciptakan dunia kerja bisnis konstruksi yang sehat dengan sumber daya manusia jasmani dan rohani yang bebas dari tindak pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).

Kata Kunci : Jaringan Irigasi Air Nga' ai , Kontraktor, Konsultan Pengawas



ABSTRACT

Implementation of the Development/Rehabilitation/Improvement of the Nga'ai Water Irrigation Network (DAK) in Lebong Tengah District at the Public Works, Spatial Planning and Transportation Department of Lebong Regency which was carried out by CV. Putra Rejang Jaya as Implementing Contractor and CV. Palemo Consultant as supervising consultant. The work was carried out within 210 calendar days with a budget of Rp. 3,199,971,700,- (Three Billion One Hundred Ninety Nine Million Nine Hundred Seventy One Thousand Seven Hundred Rupiah). In order to guarantee quality work, the contractors and supervisory consultants plus supervisors from PU are committed to maintaining accuracy in quality, costs and time. The importance of management at the work stage is to achieve company profits so that it can grow and develop optimally and can create a healthy world of construction business work with physical and spiritual human resources that are free from criminal acts of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Keywords: Nga'ai Water Irrigation Network, Contractor, Supervisory Consultant

